


MEBASwing 320 DG-HSS

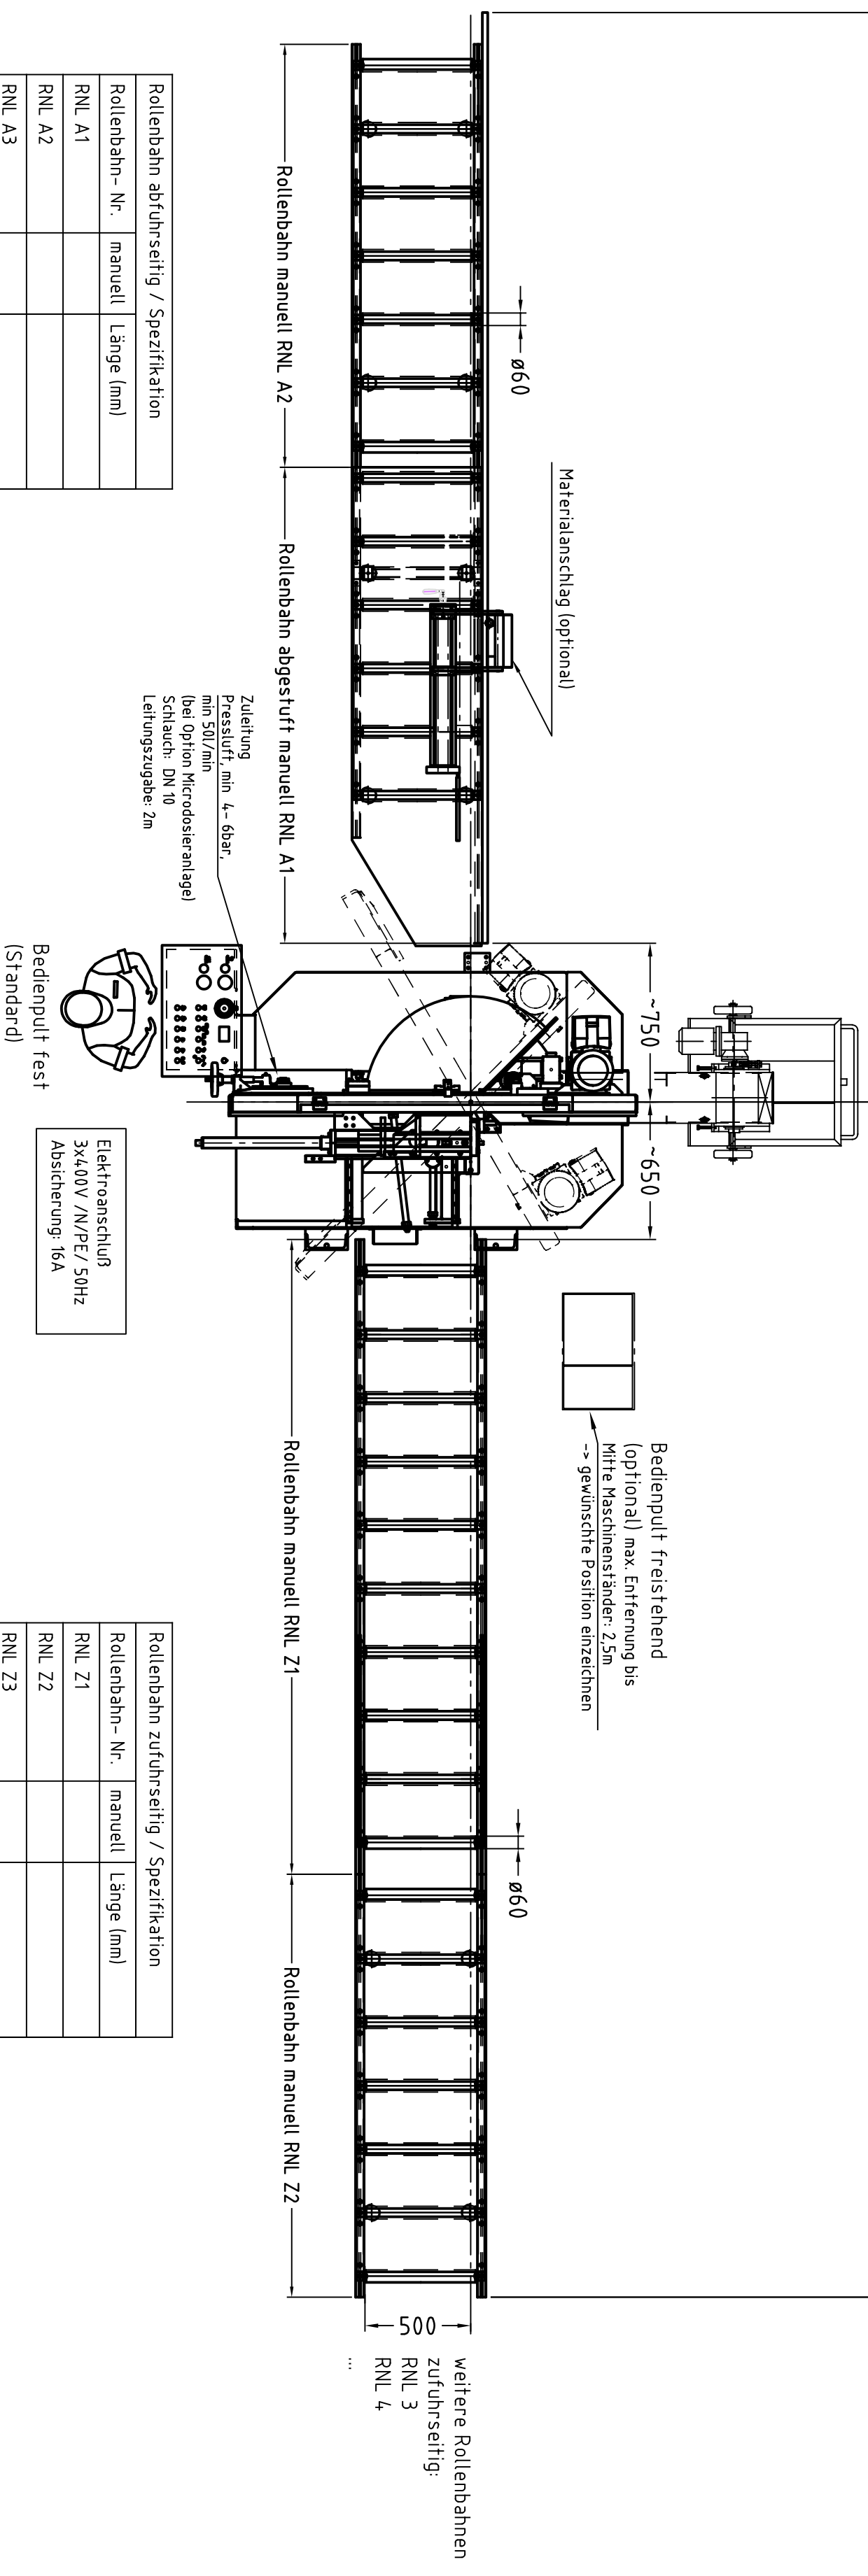

Rollenbahn abfuhrseitig / Spezifikation		
Rollenbahn- Nr.	manuell	Länge (mm)
RLL A1		
RLL A2		
RLL A3		
RLL A4		
RLL A5		
RLL A6		


Rollenbahn zurfuhseitig / Spezifikation		
Rollenbahn- Nr.	manuell	Lnge (mm)
RNL Z1		
RNL Z2		
RNL Z3		
RNL Z4		
RNL Z5		
RNL Z6		

Materialanschlag abturmseitig / optional			
Materialanschlag Typ	Länge (mm)	Anschlagverlängerung (AV) ohne AV	Messbereich (mm) mit AV
ML0 manuell			
MLD manuell			

Arbeitshöhe 750mm
(ohne Aufstelllemente)

Am Aufstellort muß eine ebenerdige Fundamentplatte mit einer Niveaufoleranz von max $\pm 20\text{mm}$ vorhanden sein. Die Fundamentplatte muß eine ausreichende Festigkeit zum Einbringen von Maschinenübelen M12x120 aufweisen und einer Druckbelastung von min. 30kg/cm^2 im Bereich der Aufstelllemente standhalten. Aufgrund von Toleranzabweichung können die Positionen der Befestigungsbohrungen für die Maschinenübelen nicht im Voraus festgelegt werden, diese müssen bei Montage abgebohrt werden!!!

optionales Zubehör (nur welches auf Zeichnung dargestellt ist)	
Bezeichnung	ja nein
Bedienpult freistehend (gewünschte Position bitte kennzeichnen)	
Heberolle manuell	
Heberolle hydraulisch	
Kratzbandförderer	
Spänewagen	
Microdosieranlage	
Aufstellenelemente Arbeitshöhe = 800mm	

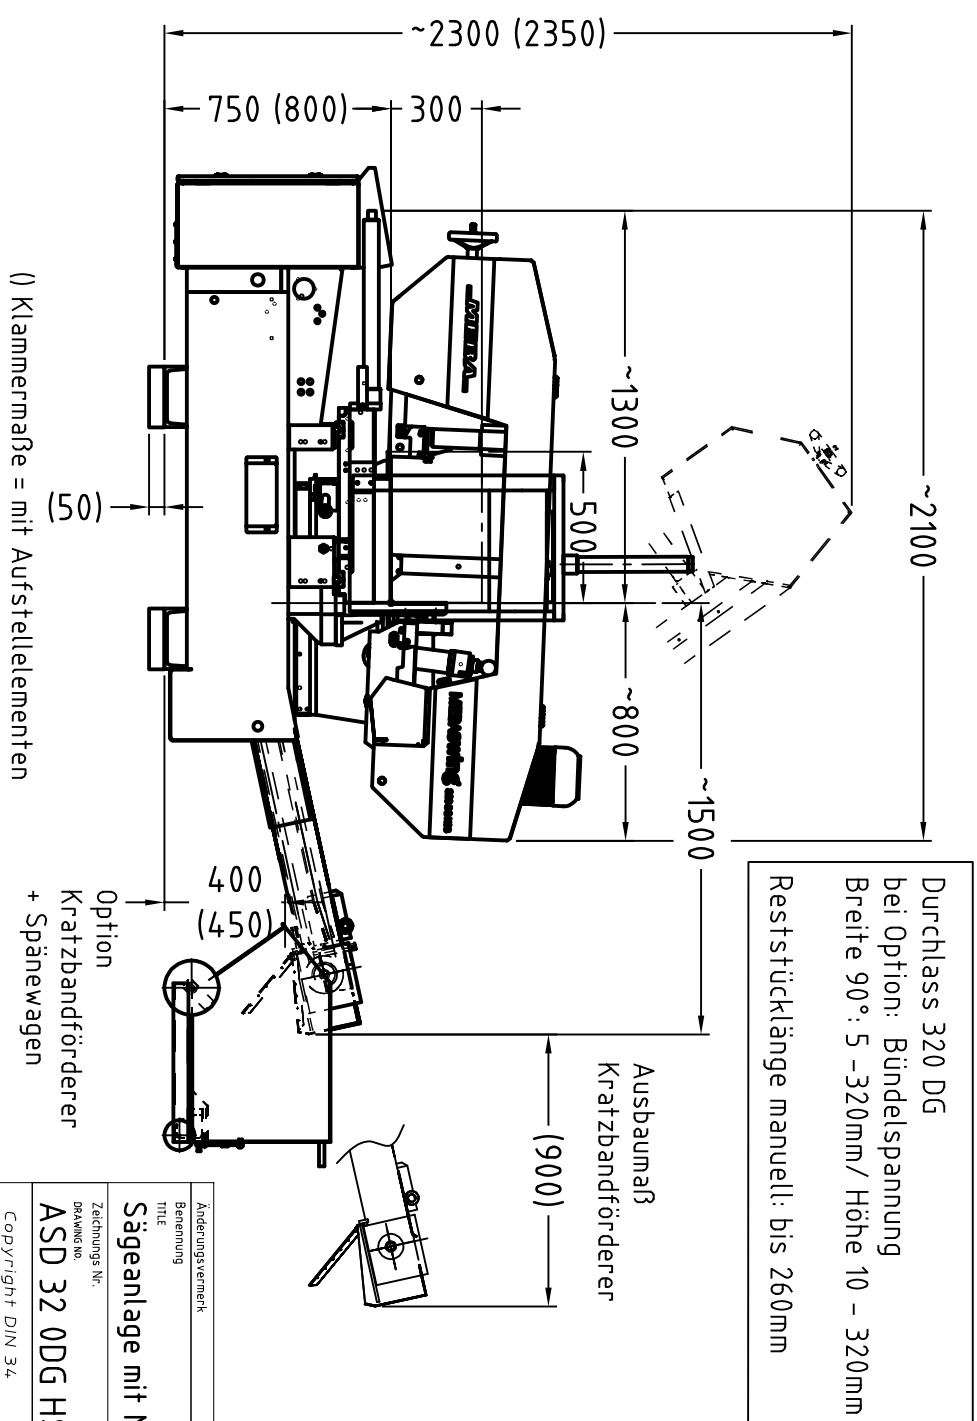

Bitte Elektrische Anschlussdaten bestätigen:

MEBA Standard Stromanschluss : 3x400V / N / PE/ 50Hz

ja ☐ nein ☐

Abweichender Stromanschluss: _____
(es wird eventuell ein Transformator benötigt !!!)

Kunde:
Kundennummer:

Änderungsvermerk		Index		Datum / Name	
Berechnung		Mitarbeiter		Datum	
Berechnung		5022		03.03.11	
Datum		Mitarbeiter		Name	
ASD 32 ODG HS		A2		MEBA	
Zustimmung Nr.		Kunde: DPT		7.75.589 WESTERHEIM	
Zustimmung Nr.		/ Leistung: GTP		Technische Änderungen vorbehalten	
Angebotnummer		Machende Nr.		von	
ASD 32 ODG HS		ASD 32 ODG HS		von	
Copyright DIN 34		Copyright DIN 34		Copyright DIN 34	
