


MEBasteel 1100 DGA-Zange

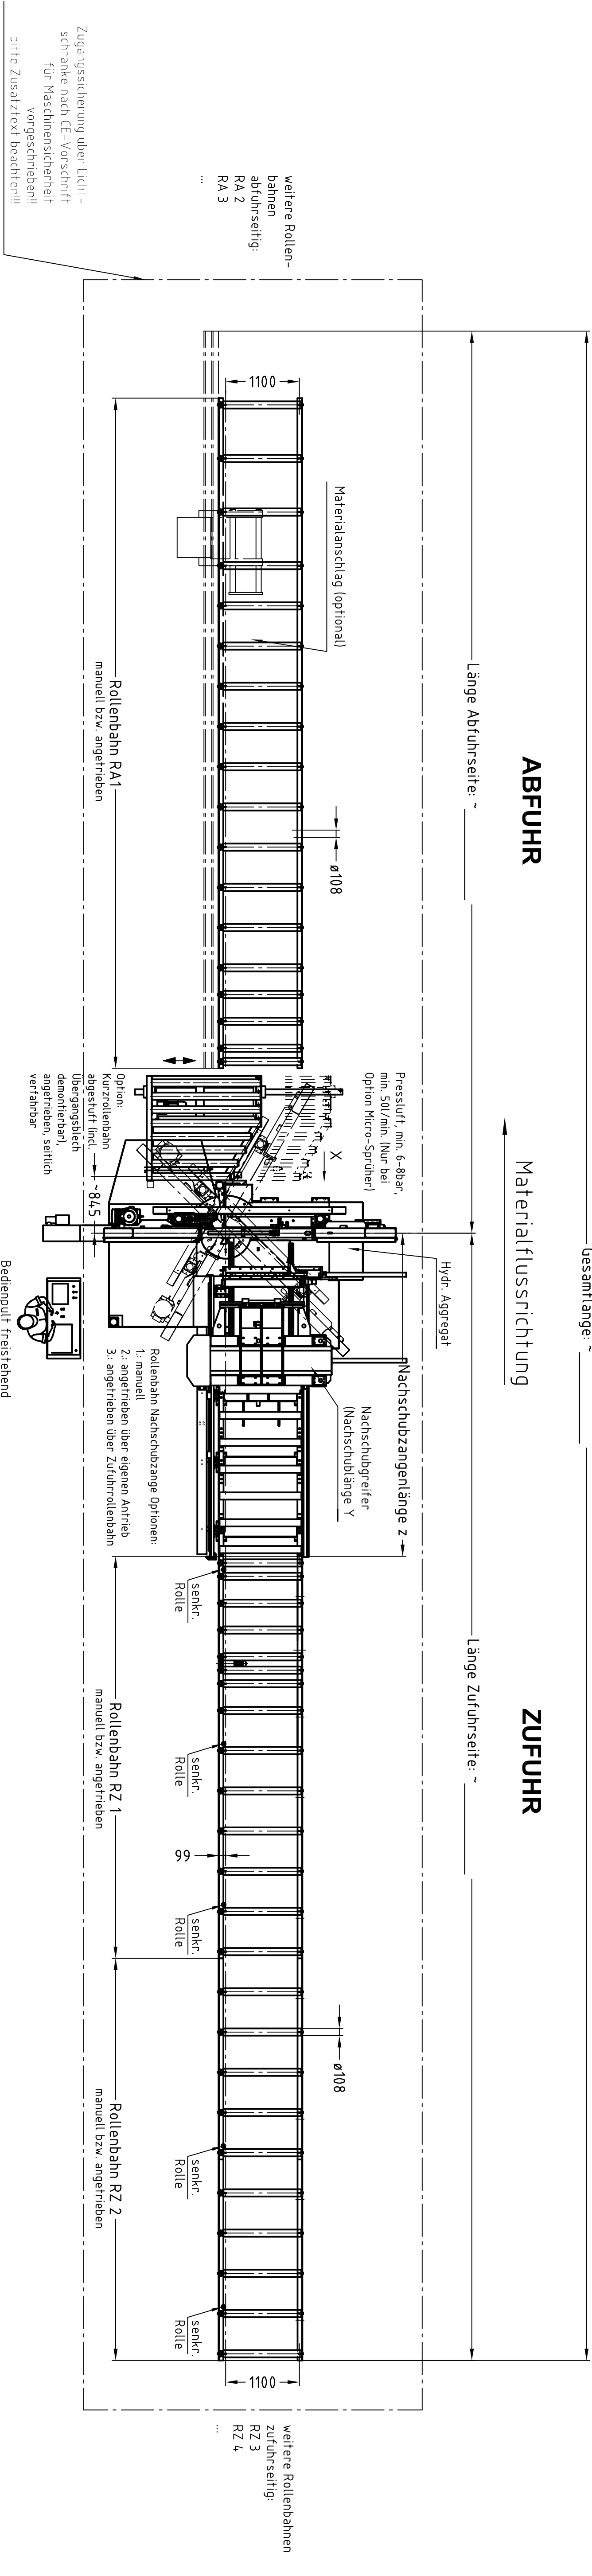

Rollenbahn abfuhreseitig / Spezifikation		
Rollenbahn- Nr.	manuell	angefr. Länge (mm)
RA 1		
RA 2		
RA 3		
RA 4		
RA 5		
RA 6		


Kurzrollenbahn abgestuft / verfahrbar	
Kundenseitiger Kabelkanal unter KR8	

Bedienpult freistehend
(Leistungslänge 8m ab Hydraulikaggregat)
Elektr. Anschluss
230V/50Hz
Elektr. Absicherung SVA
x Modem


Rollenbahn zufuhreseitig / Spezifikation		
Rollenbahn- Nr.	manuell	angefr. Länge (mm)
RZ 1		
RZ 2		
RZ 3		
RZ 4		
RZ 5		
RZ 6		

Materialanschlag abfuhreseitig / optional			
Materialanschlag Typ	Länge (mm)	Anschlagverlängerung (AV) ohne AV	Messbereich (mm) mit AV
M3 automatisch			

Nachschubzange / Spezifikation			
Nachschublänge Y	manuell	angefr. eigener Antrieb Zufuhr-R8	Nachschubzangenlänge z (mm)
2300mm			3820mm
3300mm			4820mm
4300mm			5820mm
5300mm			6820mm
6300mm			7820mm

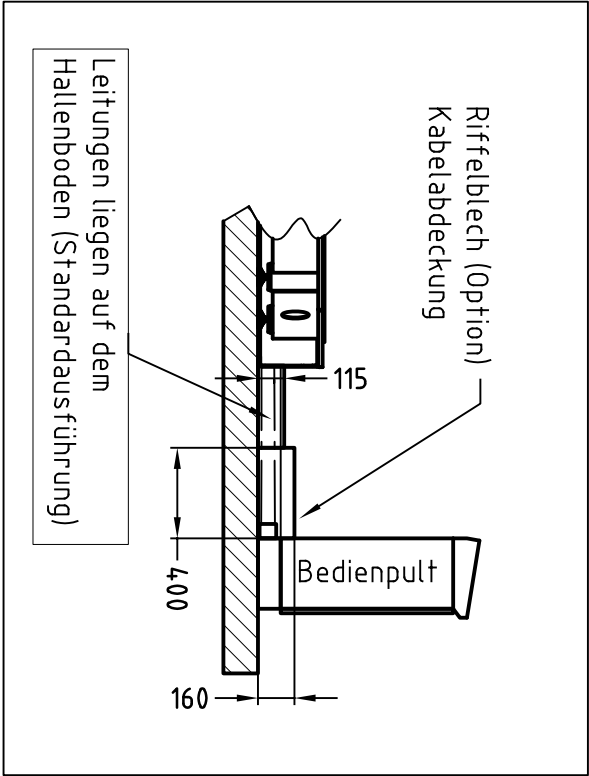

Ansicht X
M1:25

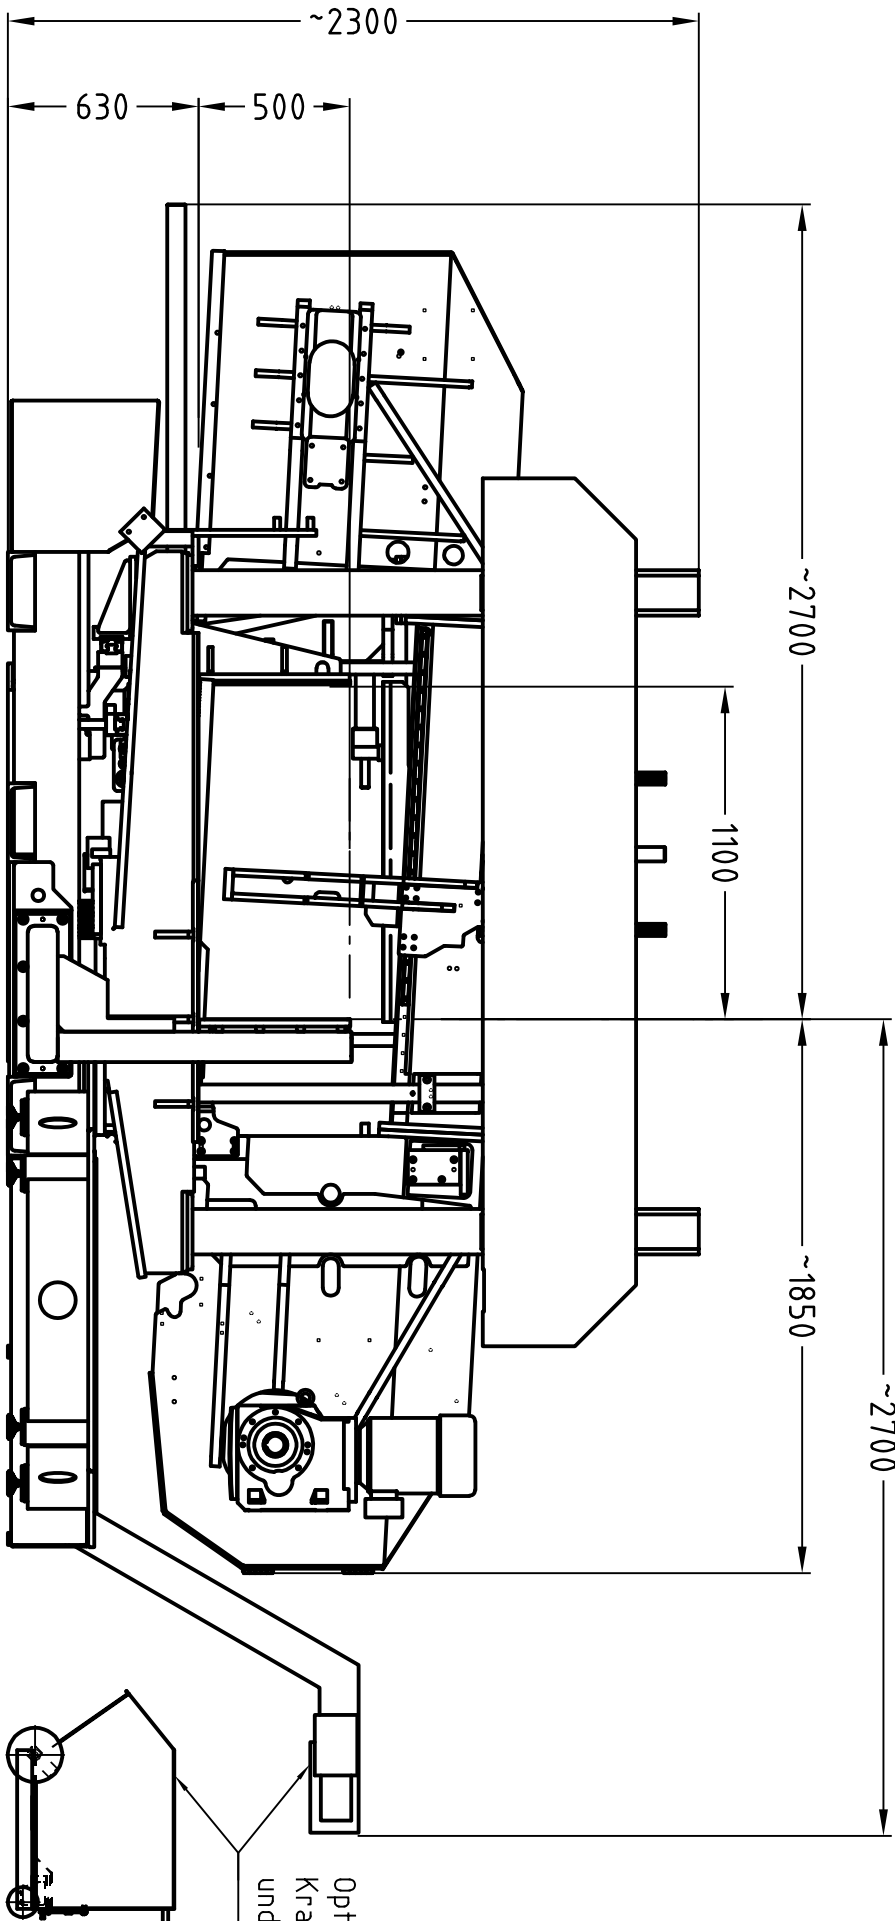

Bitte Elektrische Anschlussdaten bestätigen:
MEBA Standard Stromanschluss : 3x400V / N / PE/ 50Hz ja ☐ nein ☐

Abweichernder Stromanschluss:
es wird eventuell ein Transformator benötigt !!!

Zugangsicherung Kategorie 4 (EN954-1) nach CE-Vorschrift:
Die Inbetriebnahme und das Bedienen der Maschine ohne die Zugangsicherung ist nicht zulässig. Der Maschinenebauer ist für die erweiterte Funktion der Zugangsicherung mit der Steuerung der Maschine verantwortlich und haftbar!

Der Sicherheitsabstand zwischen Schutzfeld und Gefährstellen muß so groß sein, daß beim Eindringen in das Schutzfeld die Gefährstellen nicht erreicht werden können, bevor die gefährtönige Bewegung umkehren oder beendet ist!

Vor Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung muß durch einen Sachkundigen eine Prüfung durchgeführt werden. Der Sachkundige prüft das einwirkende Zusammenwirken der Sicherheitseinrichtung mit der Maschine. Danach muß bei jeder Veränderung der Sicherheitseinrichtung durch einen Sachkundigen eine Prüfung durchgeführt werden.

Arbeitshöhe ca. 630mm

* Wenn für Fernzugriff benötigt VPL-Leitung im Bereich Bedienpult
Leitungszugabe 2m (Steckertief) Weiterer Informationen siehe Dokument: MEBAtelerservice, Checkliste, Beschreibung, AGB

Am Aufstellort muß eine ebenerdige Fundamentplatte mit einer Niveauoleranz von max. 20mm vorhanden sein. Die Fundamentplatte muß eine ausreichende Festigkeit zum Einbringen von Maschinenfüßen M12x120 aufweisen und einer Druckbelastung von min. 30kg/cm² standhalten. Aufgrund von Toleranzabweichungen können die Positionen der Befestigungsbohrungen für die Maschinendeckel nicht im Voraus festgelegt werden, diese müssen bei Montage abgebohrt werden !!

optionales Zubehör (nur welches auf Zeichnung dargestellt ist)	
Bezeichnung	ja nein
Bedienpult freistehend gewünschte Position bitte kennzeichnen /	✗ —
Kratzbandförderer	
Spänewagen	
NC-Server	
Serverventilator Fernwartung	
Microdieservanlage	
Bündelspannung	
Zugabsicherung kundenspezifisch (z.B. Kombination Lichtschranke / Schutzzaun/ größere Reichweite)	
Erweiterung zur Standardlichtschranke notwendig !!	
Zentrale Hydraulikversorgung bei hydr. Abschiebern	

Kundennummer:		Datum:		Seite:	
150		24.03.11		HU	
Sägeanlage mit MEBasteel 1100 DGA-Zange		MEBA		72589 WESTERHOFEN	
ASD 11 00G A1		72589 WESTERHOFEN		72589 WESTERHOFEN	
Copyright DIN 24		Copyright DIN 24		Copyright DIN 24	
