

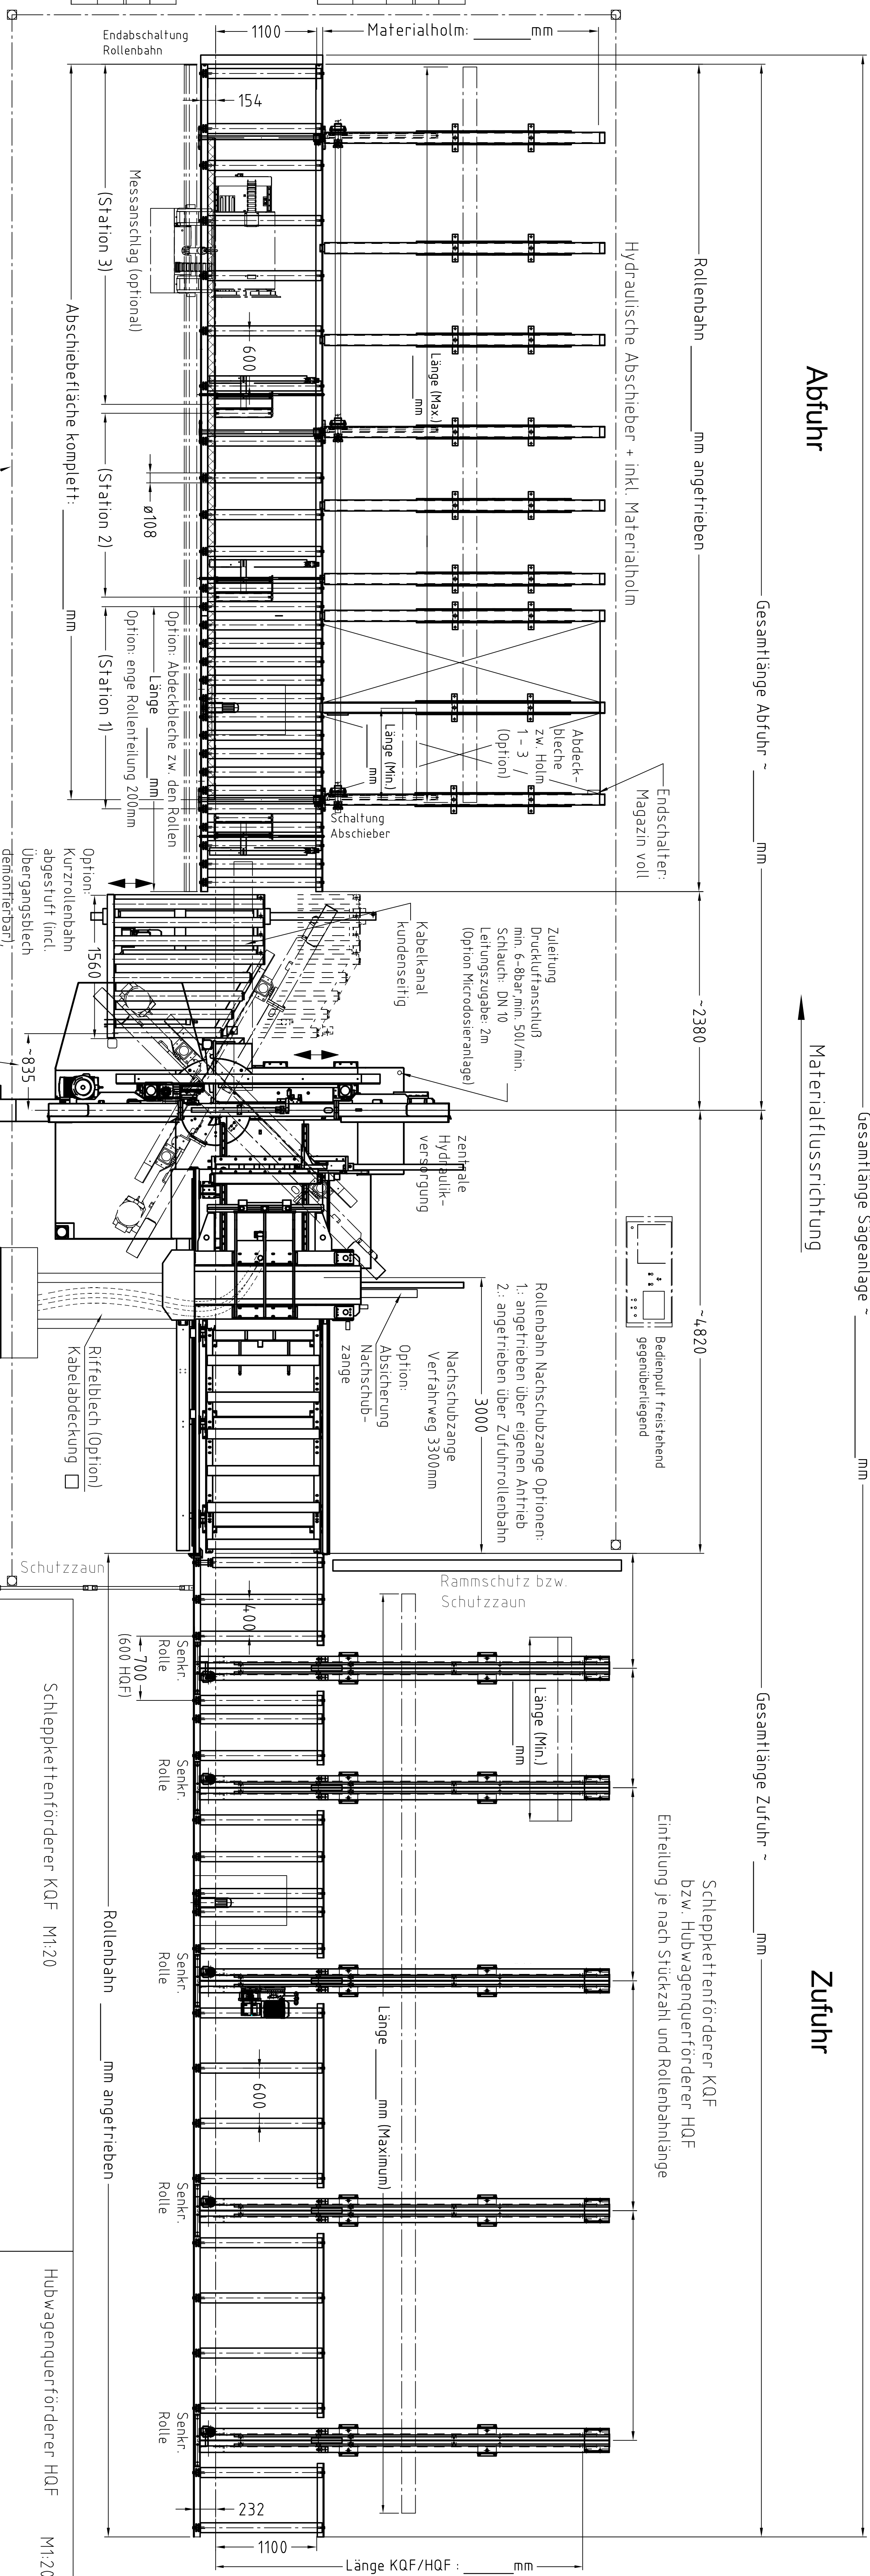


Sägeanlage mit **MEBasteel** 1100 DGA-3300

Abfuhr

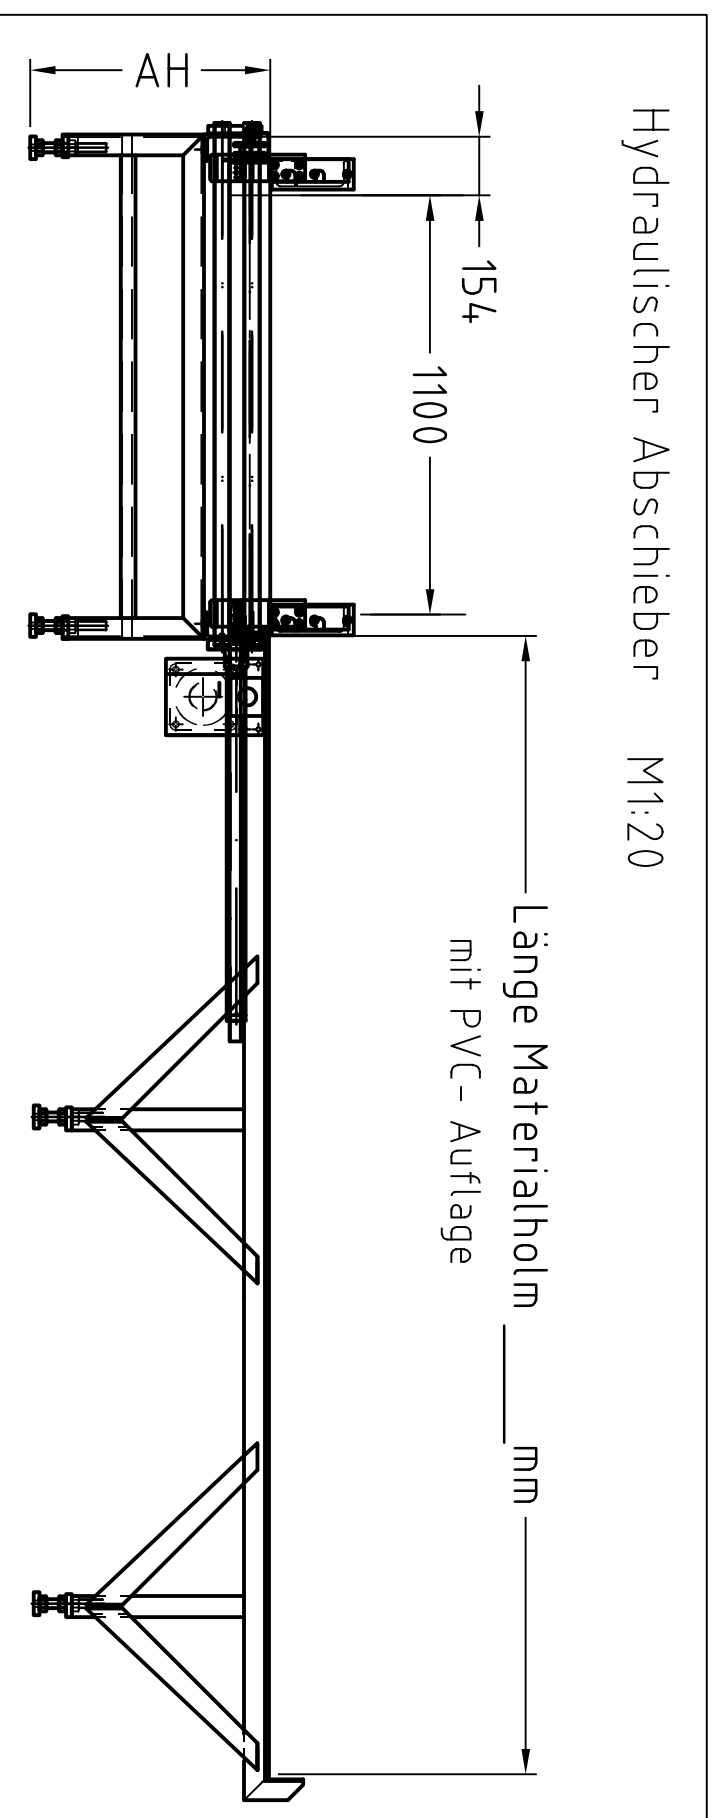

Zufuhr

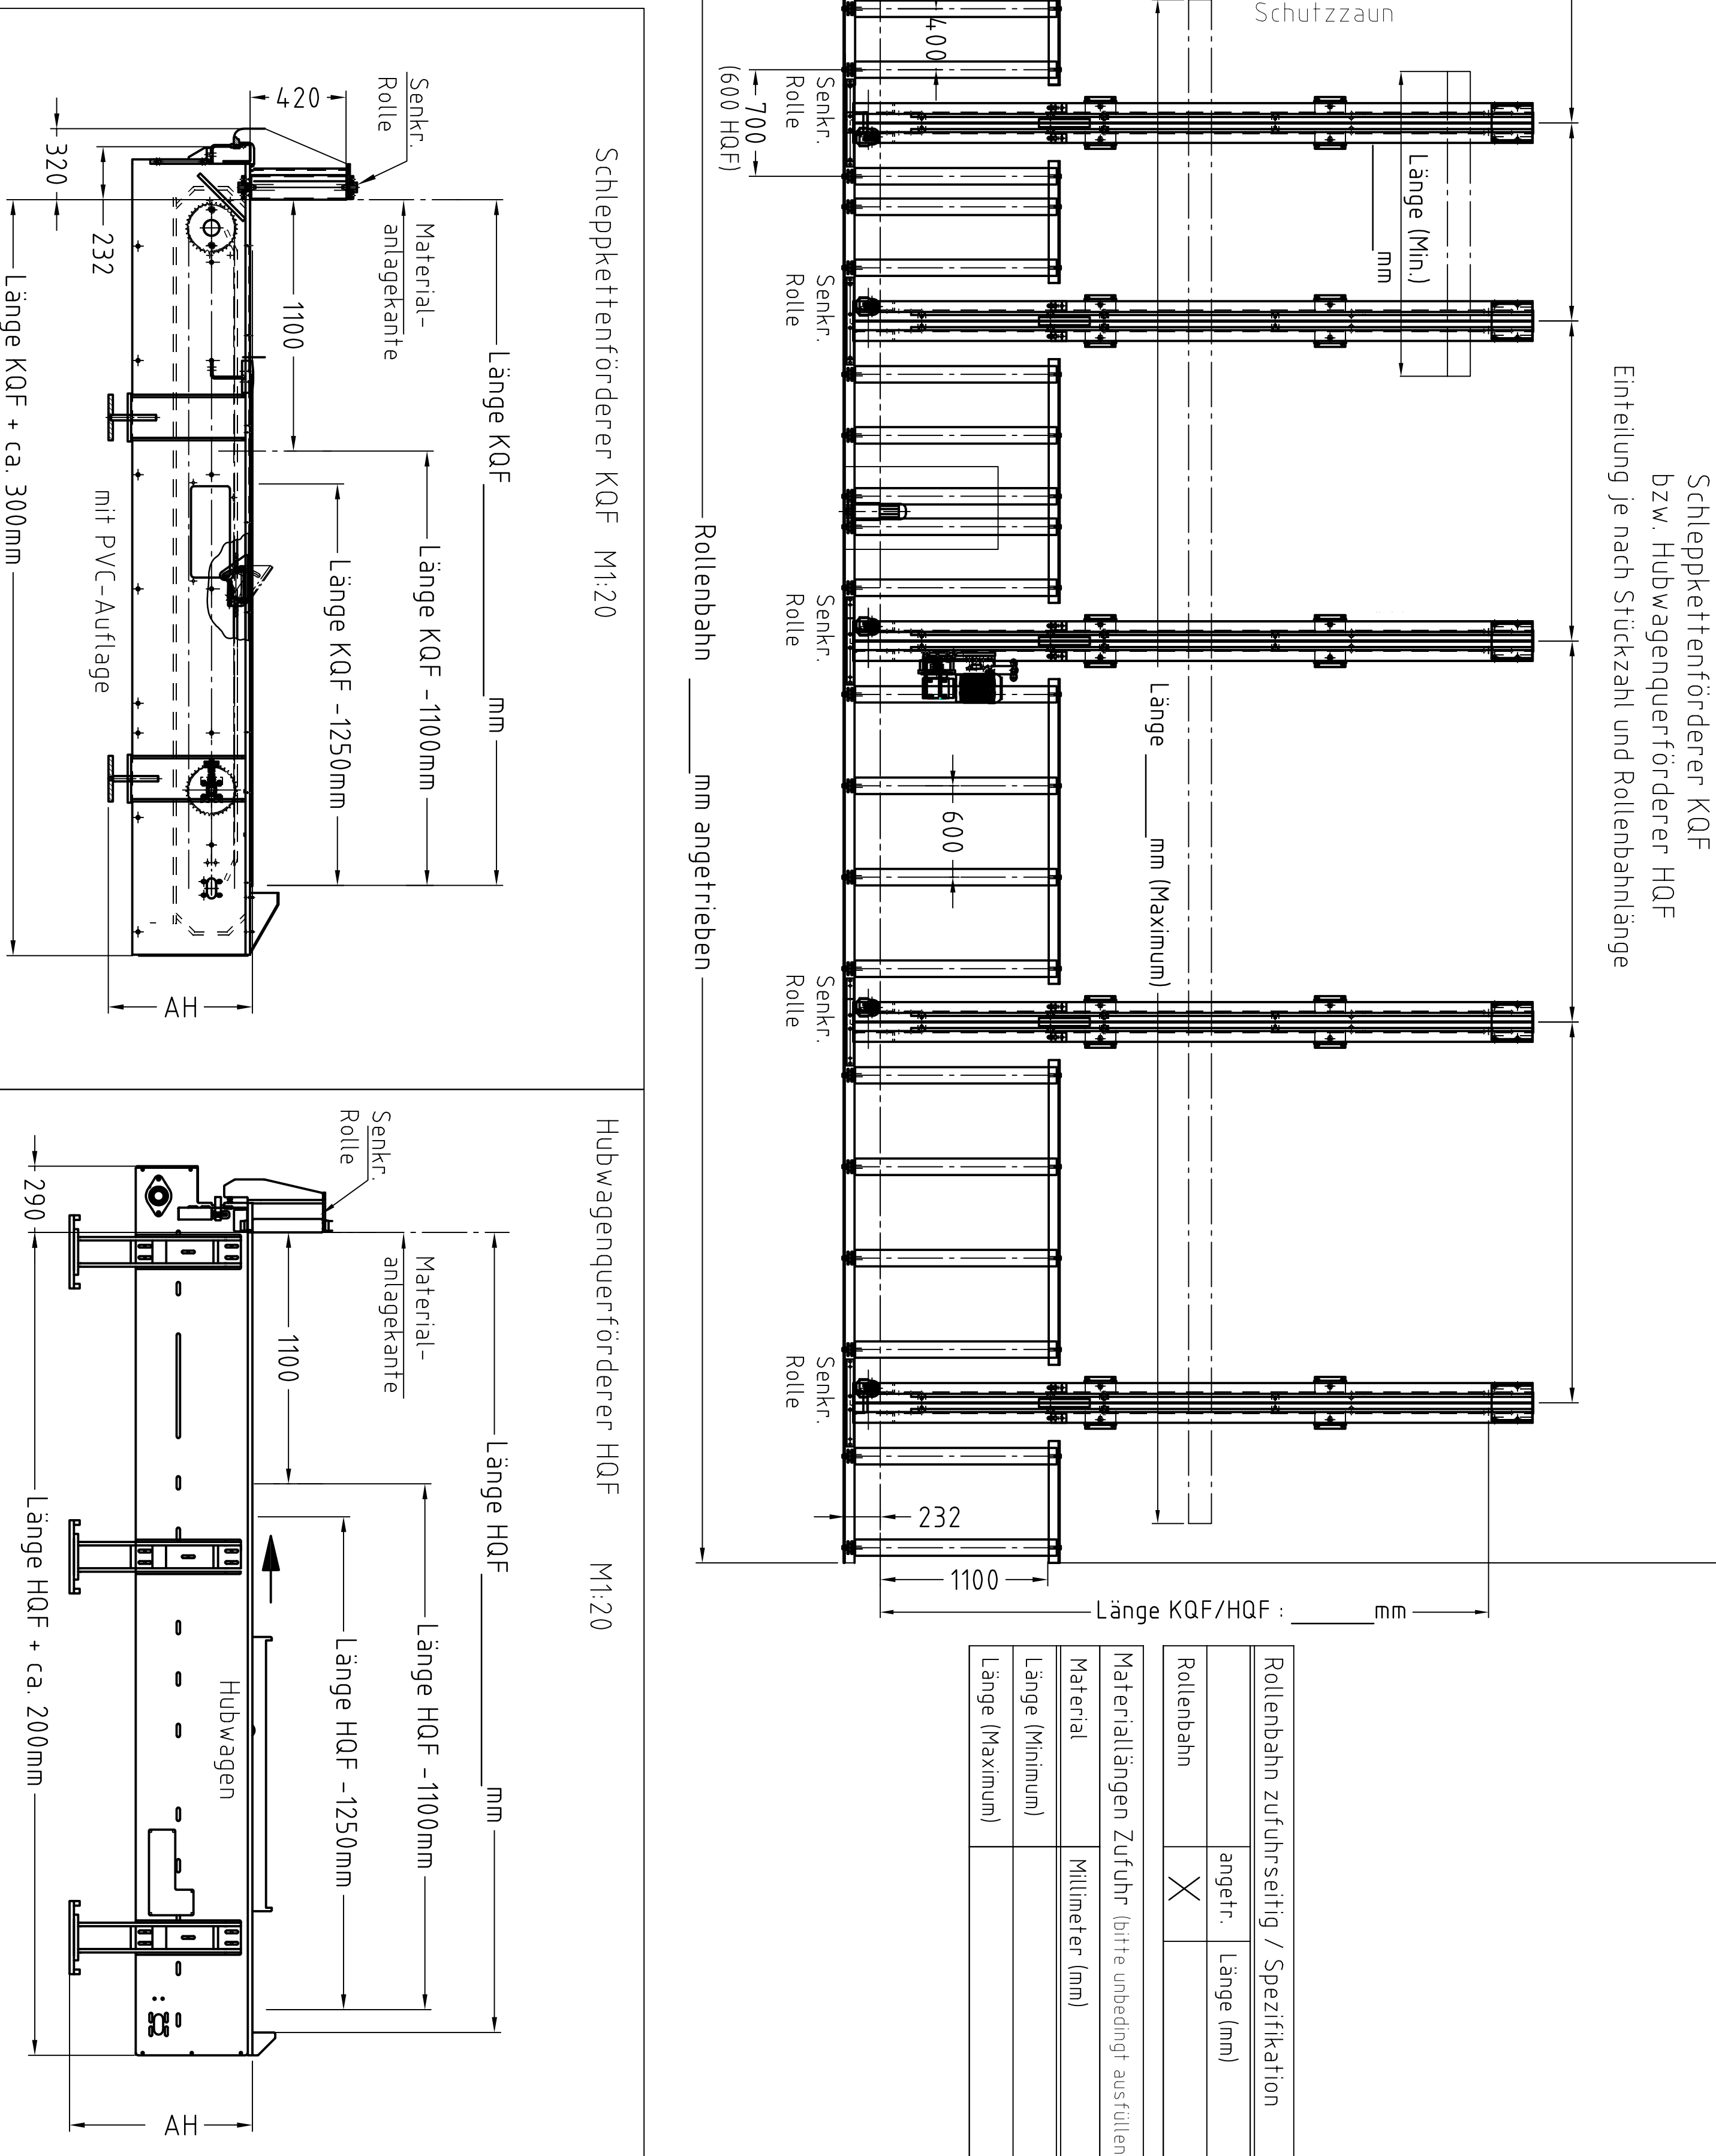

Spezifikationen	ja	nein	Stückzahl	Länge (mm)
Hydr. Abschieber inkl. Materialholm				
Länge Holm (mm) bitte ankreuzen	☒			
			☐	2000mm
			☐	3000mm
			☐	4000mm
			☐	_____mm Länge Kundenwunsch
Abschiebebereich komplett				
zusätzl. Abschiebestationen				
Abdeckblech zw. Holm 1 + 3				

Materialanschlag abfuhrseitig / optional

Materialanschlag abtuhseitig / optional			
Materialanschlag	Länge (mm)	Anschlagverlängerung (AV) ohne AV	Messbereich (mm) mit AV
MS3 automatisch			

Bitte Elektrische Anschlussdaten bestätigen

MEBA Standard Stromanschluss:

3x400V / N / PE / 50Hz ja ☐

Abweichender Stromanschluss: _____
(es wird eventuell ein Transformator benötigt !!!)

Zugangssicherung Kategorie 4 (EN954-1) nach CE-Vorschrift


Anlagenbetreiber ist für die einwandfreie Funktion der Zugangssicherung mit der Steuerung der Maschine verantwortlich und haftbar.

Der Sicherheitsabstand zwischen Schutzziel und Gefährsziel muß so groß sein, daß beim Eindringen des Schutzziels die Gefährszielen nicht erreicht werden können, bevor die gefährbringende Bewegung umkehrbar oder beendbar ist.


Für die Ermittlung des Sicherheitsabstandes ist als Wert für die Greifgeschwindigkeit mindestens 16 m/s zugrunde zu legen.

Vor Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung muß durch einen Sachkundigen eine Prüfung durchgeführt werden. Danach muß bei jeder Veränderung der Sicherheitseinrichtung durch einen Sachkundigen eine Prüfung durchgeführt werden.

Materialflussrichtung

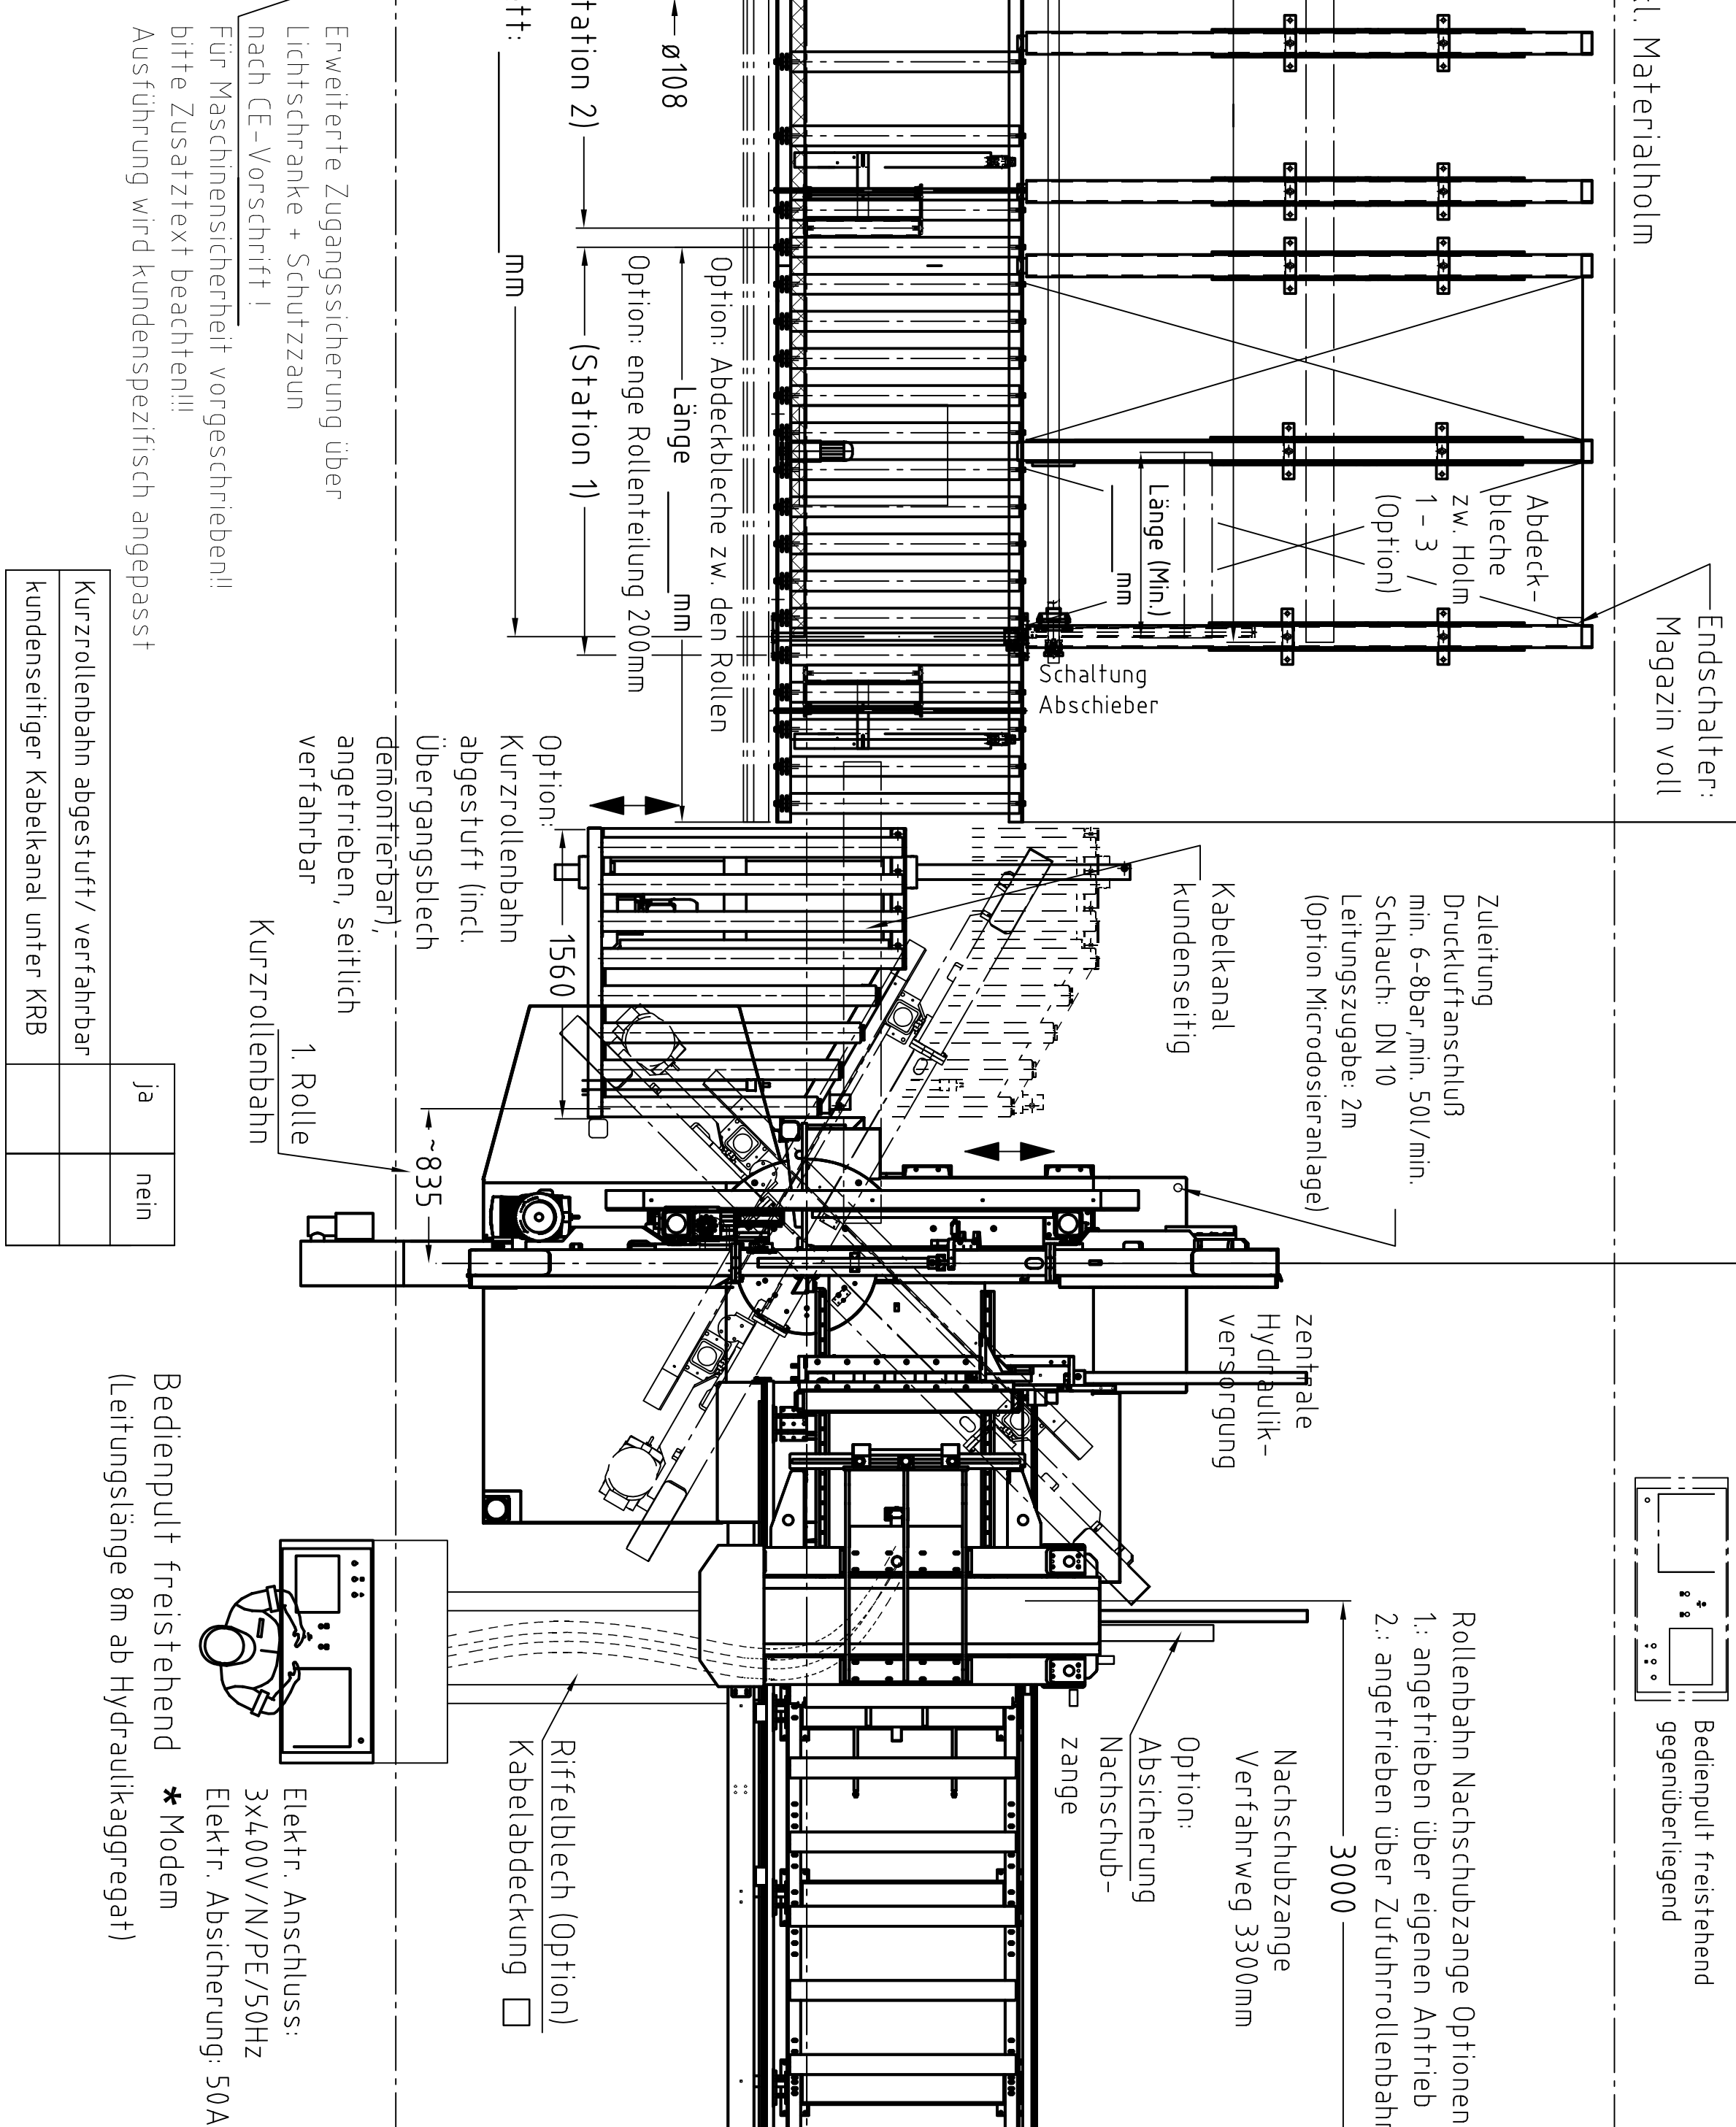

	ja	nein
Kurzrollenbahn abgestuft/ verfahrbar		
kundenseitiger Kabelkanal unter KRB		

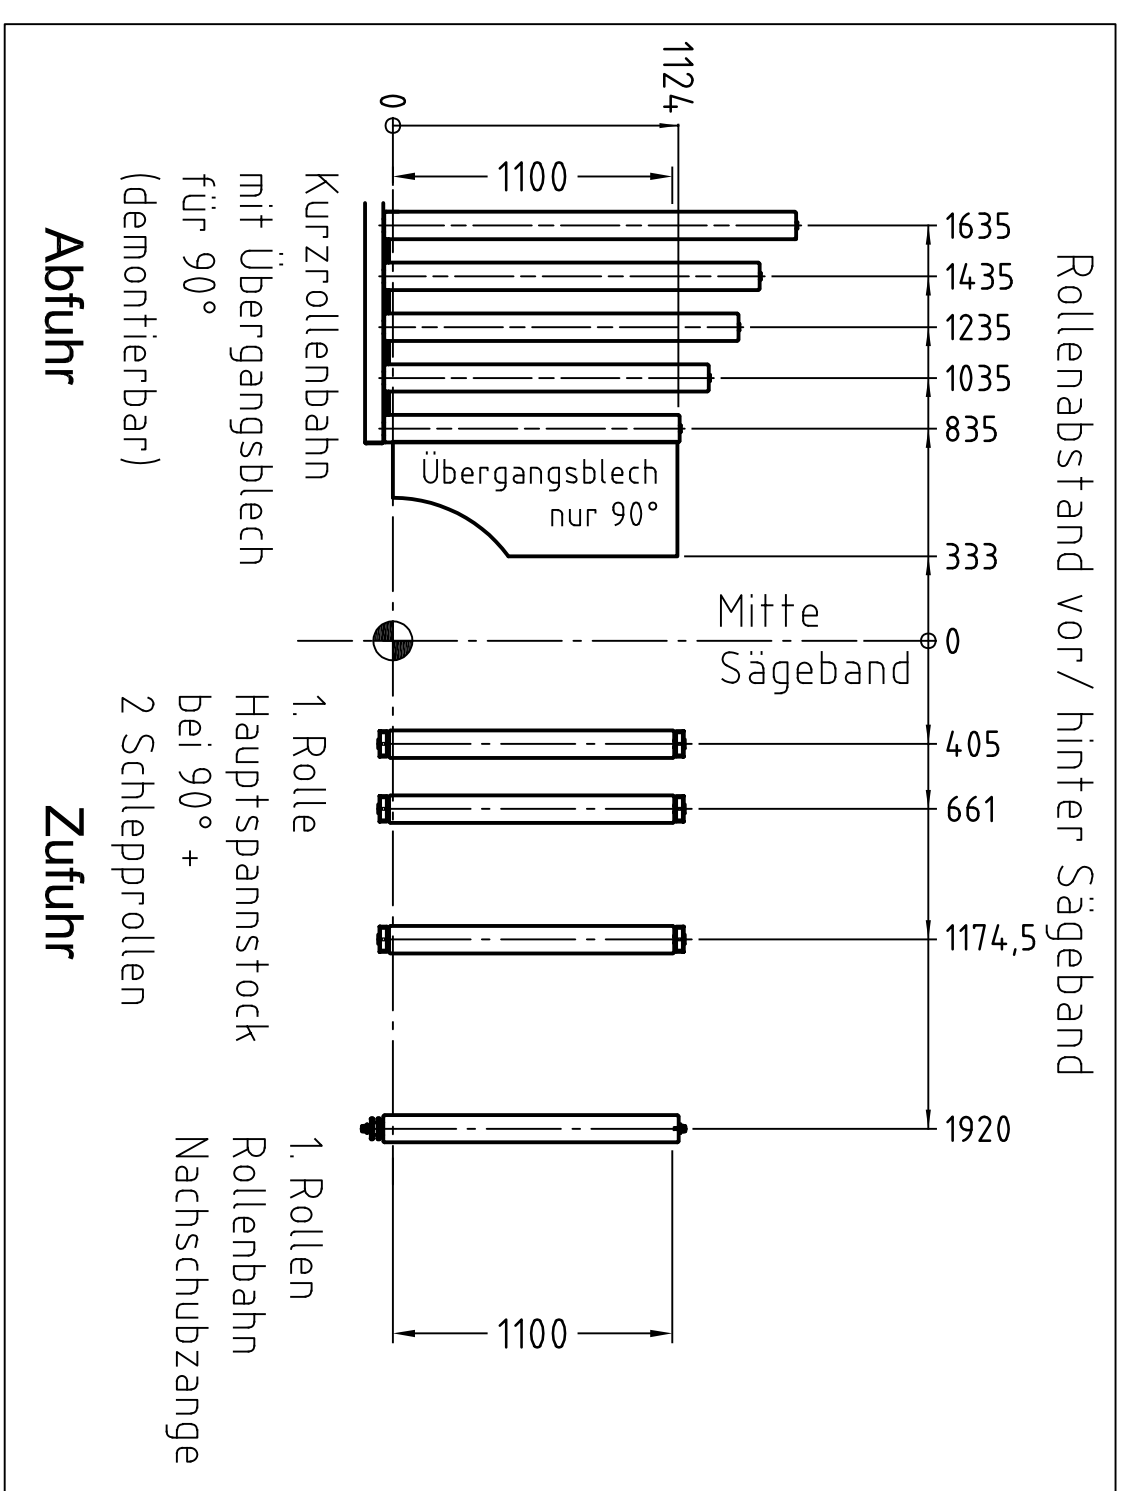

politisches Zuteilbar (nur weiches auf Zeichnung dargestellt ist)	ja	nein
Bedienfeld feststehend gewünschte Position bittet Lebenszeitdauer /	X	—
Kraibzand für derer		
Spätereagen		
NC-Server		
Serverrouter / Fernleitung		
Microdosieranlage		
Brandschranke		
Zugangssteuerung kundenspezifisch (z. B. Kombination (idtschraue / Schutzzaun/ gedrehte Reichweite) Erweiterung zur Standardrichtschraube nichtwendig !!		
Zentrale Hydraulikversorgung bei jeder Abschleppen		

Arbeitshöhe ca. 630mm

* 'Modem für Fernzugriff' benötigt VPN-Leitung im Bereich Bedienpult


Leitungszugabe 2m (Steckerfertig)

Weitere Informationen siehe Dokument


MEBAteservice_Checkliste, Beschreibung, AGB

Am Aufstellort muß eine ebenerdige Fundamentplatte mit einer Niveautoleranz von max. ±20mm vorhanden sein. Die Fundament-plattform muß eine ausreichende Festigkeit zum Einbringen von Maschinendübel M12x120 aufweisen und einer Druckbelastung von min. 30kN/cm²

Aufgrund von Toleranzabweichung können die Positionen der Befestigungsbohrungen für die Maschinendübel nicht im Voraus festgelegt werden, diese müssen bei Montage abgebohrt werden !!

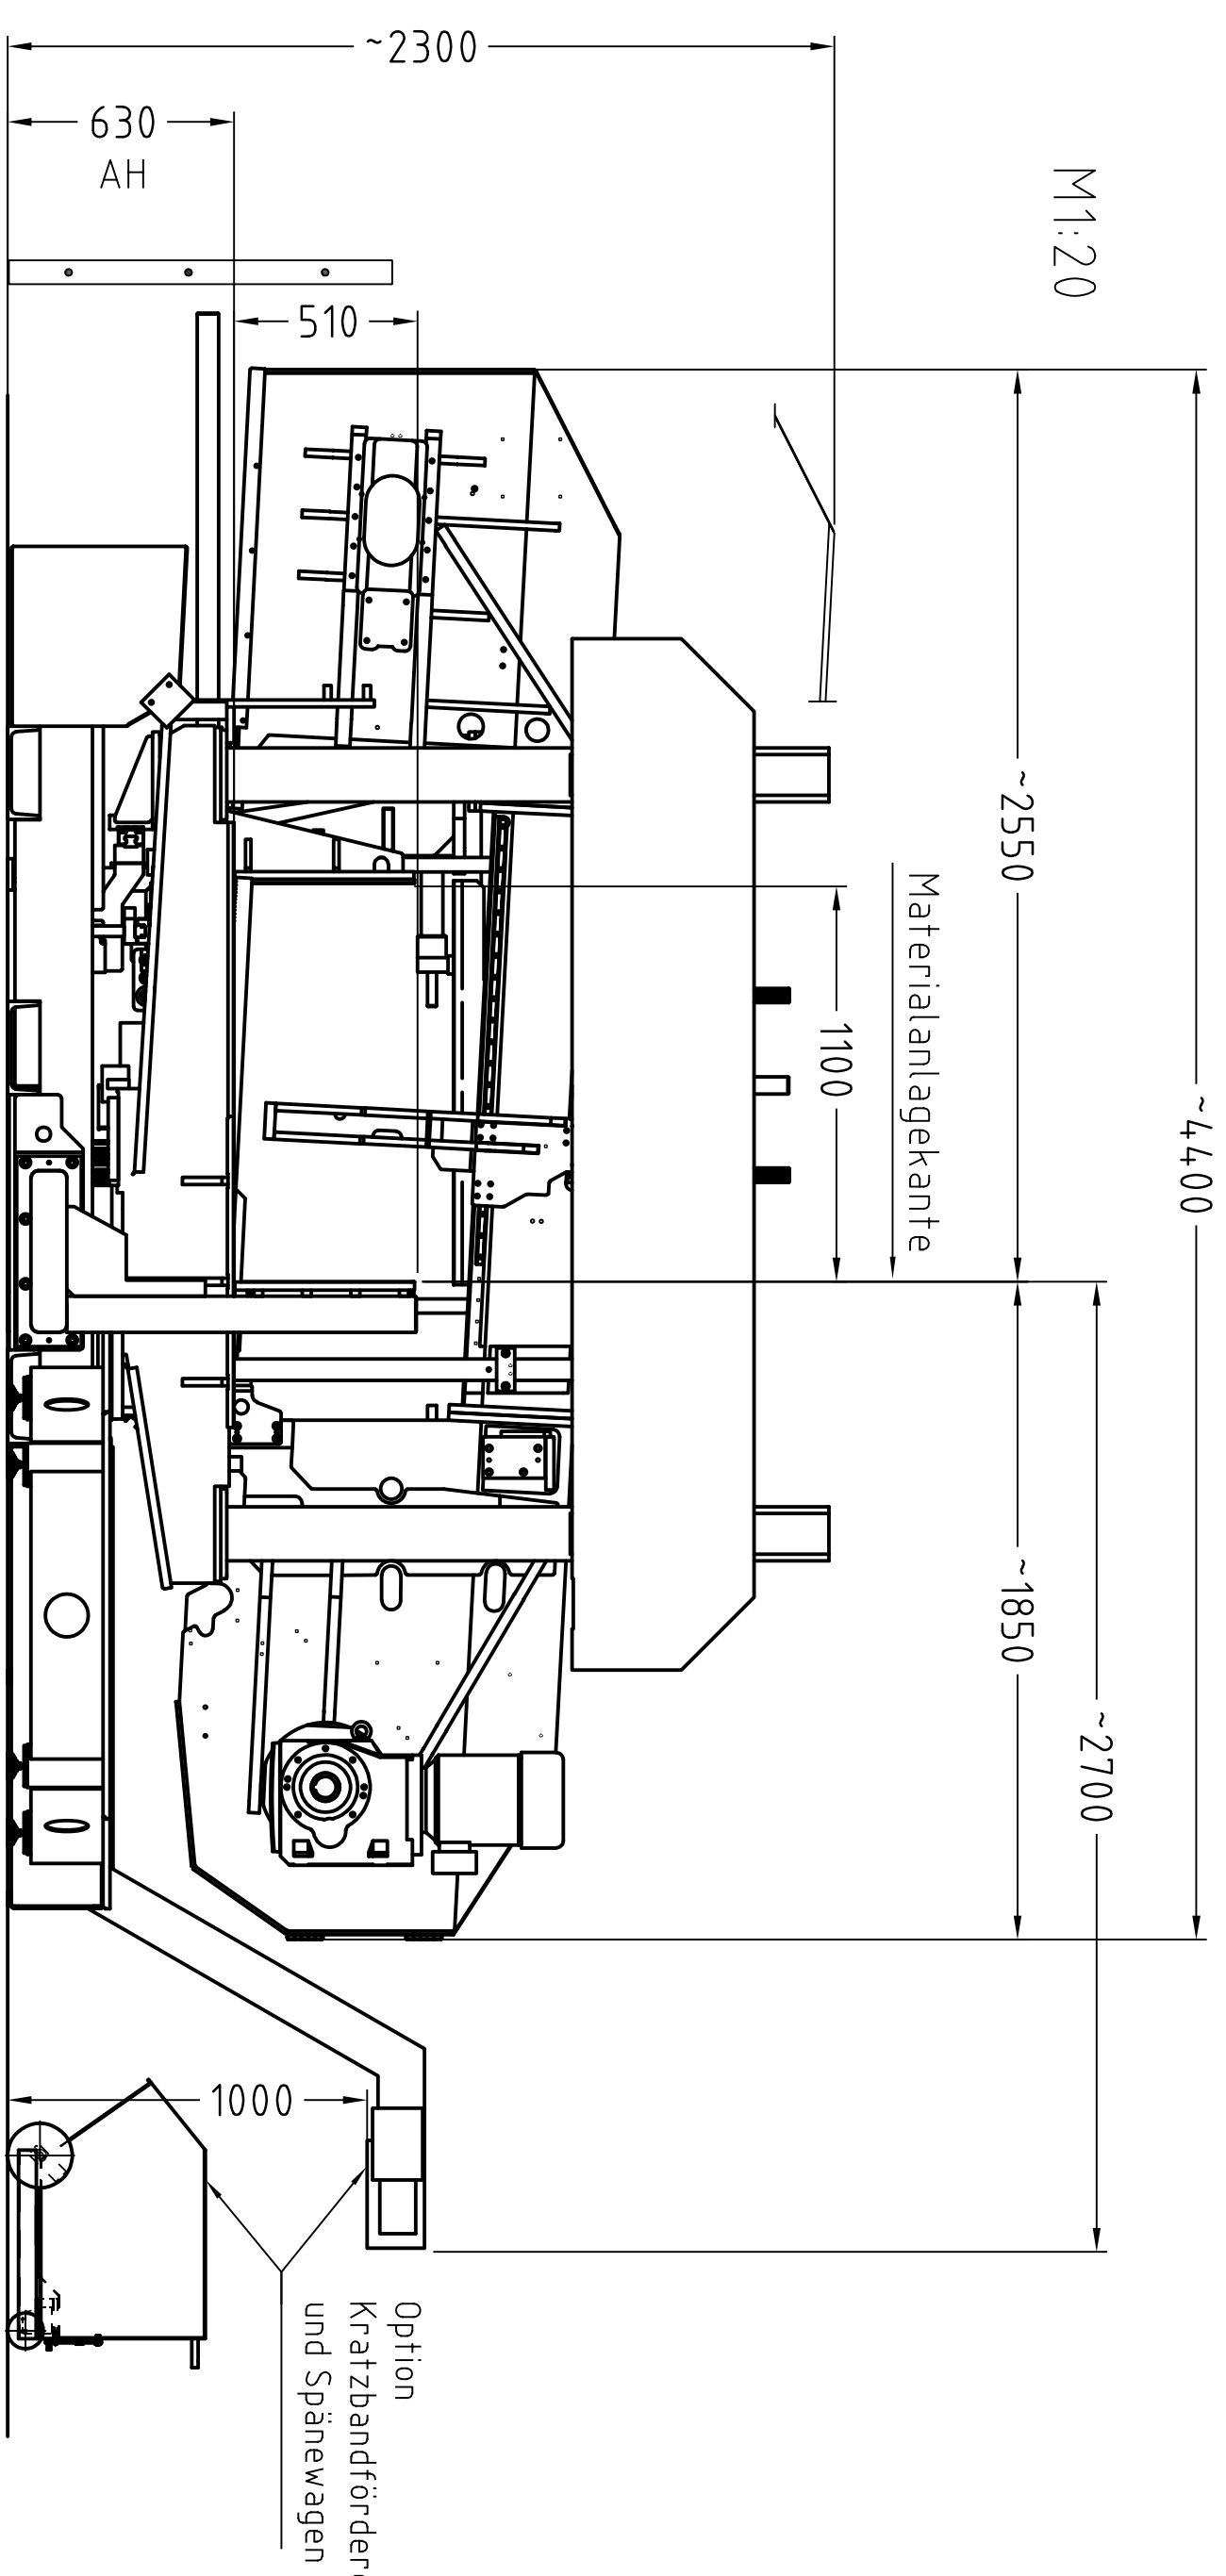

M1:20

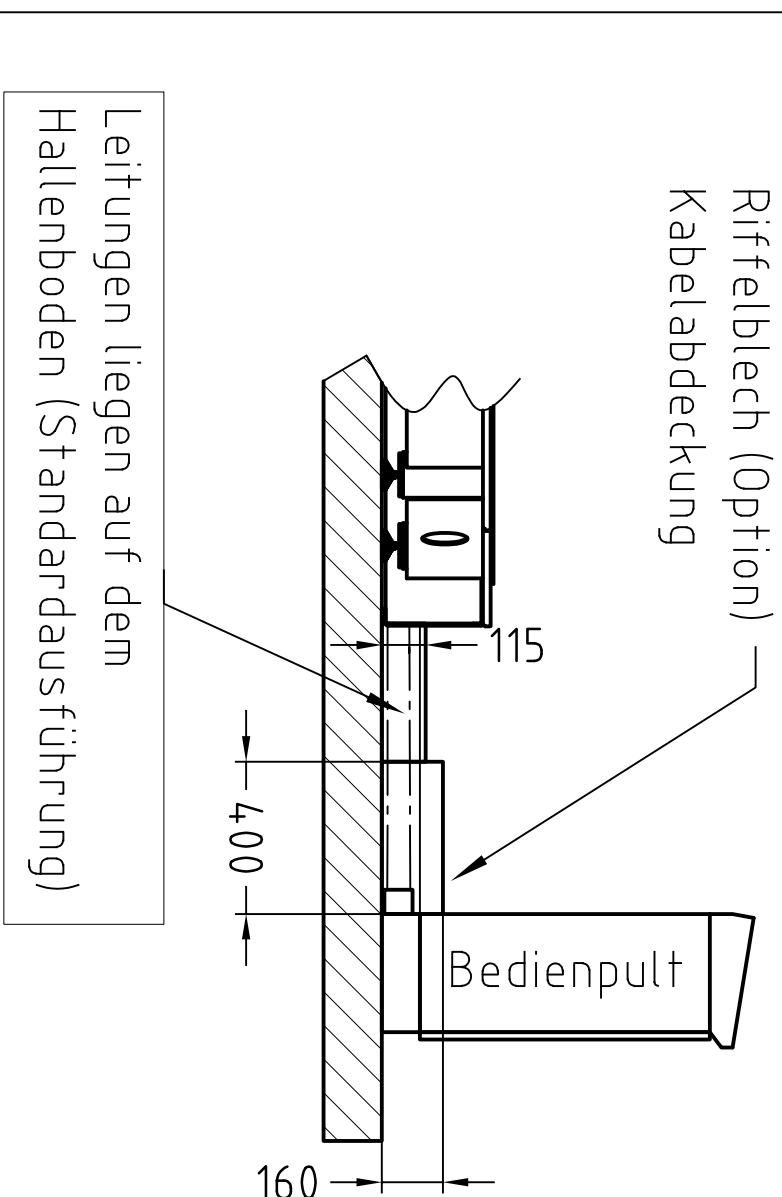

Hallenboden (Standardausführung)

Kunde

Kundennummer:

Bestellungsnummer		Lieferant		Datum		Uhrzeit	
Bestellung		Soll		12.06.18		14	
MEBA 7389 HESTERHOF 7389 HESTERHOF Telefon: 04302 907-10 Telefax: 04302 907-10							
Querfordersystem mit MEBAsteck 1100 DGA-3300 130 00 A0				130 00 A0			
Zustellung		Anfertigungsdatum		Fertigstellungsdatum		Fertigstellungsdatum	
ASD 11 DGA LT		Anfertigungsdatum		Fertigstellungsdatum		Fertigstellungsdatum	
C209/0001 DNV 34		Anfertigungsdatum		Fertigstellungsdatum		Fertigstellungsdatum	
